

# КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

# 01

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, %

77,6

ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн. руб.

1 896,9

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, %

103,3

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации города от 28.06.2013 №1304

### Ответственный исполнитель

Департамент строительства администрации города

### Цель

Создание условий для комфортного проживания граждан на территории города

### Основные мероприятия

1. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства
2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования
3. Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта
4. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них
5. Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)

6. Реализация мероприятий по обеспечению земельных участков для индивидуального жилищного строительства внутриквартальными проездами (грунтовыми дорогами)
7. Обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
8. Реализация мероприятий на объектах незавершенного строительства

### Региональные проекты

1. Спорт - норма жизни
2. Жилье

### Проекты города

1. Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска
2. Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы N 21 до улицы Северной
3. Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев
4. Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем

## СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке земельных участков для жилищного строительства обеспечил ввод 39,0 тыс. кв. м жилья, из них 27,7 тыс. кв. м - индивидуальные жилые дома и жилые дома на садовых участках (260 домов).

Введен в эксплуатацию детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6).

В рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" продолжалось строительство спортивного комплекса "Центр боевых искусств".

Кроме того, продолжалось строительство объекта "Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №40-42".

В ходе реализации регионального проекта "Жилье" введены в эксплуатацию объекты:

- город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной;
- улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска.

Разработана проектная документация по объекту "Улица Героев Самотлора от улицы Северной до улицы Тимошкова города Нижневартовск". В стадии разработки проектная документация по объекту "Многофункциональный комплекс в 27 квартале г. Нижневартовска".

Также проведено обследование и велась разработка проектной документации по демонтажным работам объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс для Нижневартовского государственного педагогического института. Блок "А". г. Нижневартовск".

## СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

По итогам 2024 года плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме.

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения планового значения, %
1.	Объем жилищного строительства, тыс.кв.м	28,7	<b>39,0</b>	<b>135,9</b>
2.	Ввод объектов образования, ед.	1	<b>1</b>	<b>100,0</b>
3.	Объем разработанной проектной документации, ед.	1	<b>1</b>	<b>100,0</b>
4.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	153,57	<b>153,57</b>	<b>100,0</b>
5.	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	1,83	<b>1,83</b>	<b>100,0</b>
6.	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), км	1,83	<b>1,83</b>	<b>100,0</b>
7.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км	1,83	<b>1,83</b>	<b>100,0</b>
8.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км	141,57	<b>141,57</b>	<b>100,0</b>
9.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	92,2	<b>92,2</b>	<b>100,0</b>

к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %			
10. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации региональной программы, предусматривающей выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, %	100	<b>100</b>	<b>100,0</b>
11. Количество реализованных проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства, ед.	2	<b>2</b>	<b>100,0</b>

**СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**


**103,3**

## СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено **1 896,9 млн. рублей**. Расходы по муниципальной программе за счет всех источников финансирования составили **1 472,5 млн. рублей** или **77,6%** от плана, что обусловлено:

- переносом срока завершения строительства объекта "Многофункциональный комплекс в 27 квартале г. Нижневартовска" на 2026 год, в том числе наличием в плановых значениях 2024 года бюджетных ассигнований спонсорских средств со сроком их освоения в 2025 году;
- нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ по объекту "Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №40-42" в связи с повышением заболоченности и высокого уровня грунтовых вод на объекте;
- экономией средств по выполненным работам на объектах "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г.Нижневартовска", "Физкультурно - оздоровительный комплекс для Нижневартовского государственного педагогического института. Блок "А". г. Нижневартовск".

## Структура источников финансирования муниципальной программы, млн. руб.

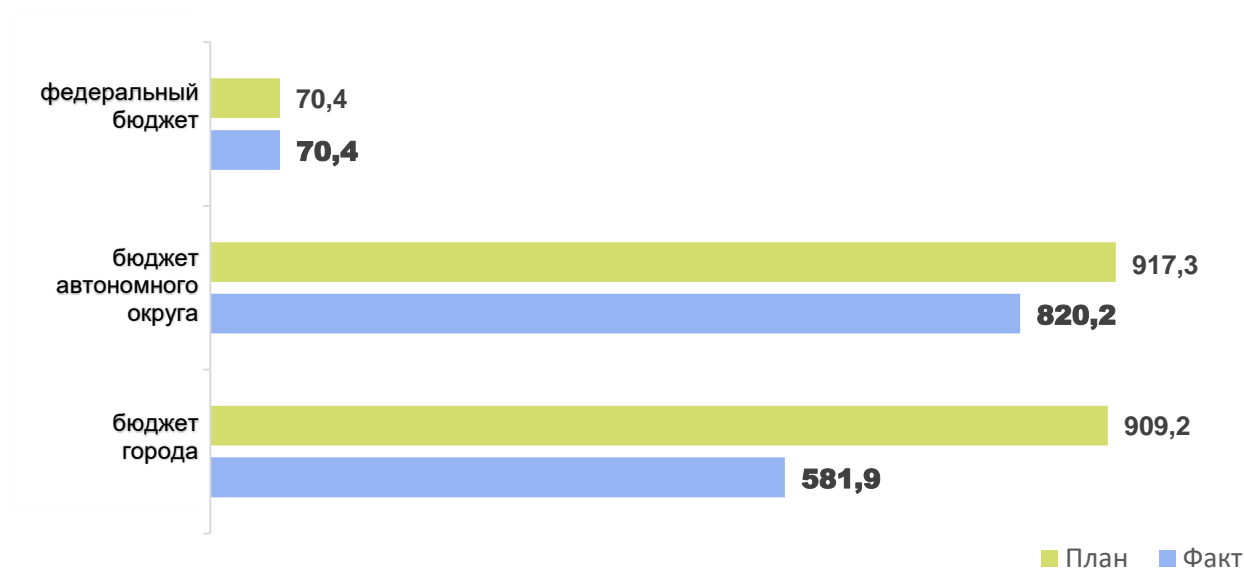

## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Комплексный критерий оценки эффективности составил **6,7 балла**, степень эффективности реализации муниципальной программы – **выше средней**.
