

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

02

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, %

80,5

ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн. руб.

497,0

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, %

98,0

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации города от 15.12.2015 №2252

Ответственный исполнитель

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Цель

Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города

Основные мероприятия

1. Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства
2. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса
3. Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы
4. Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий
5. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде
6. Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Произведена модернизация (реконструкция) 7,295 км сетей и 15 объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

Актуализированы схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года.

Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам. За 2024 год объем реализованного газа в соответствии с потребностью населения составил 847 кг.

Выполнено благоустройство дворовых территорий: ремонт внутриквартальных проездов - более 6,5 тыс. кв. м, тротуаров - 3,2 тыс. кв. м, мест стоянки автотранспортных средств - более 1,6 тыс. кв. м, замена и ремонт 764,88 п. м. ограждений и 54 малых архитектурных форм.

Выполнен ремонт 35 жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих предоставлению гражданам в соответствии с действующим законодательством (повторное заселение).

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

По итогам 2024 года плановые значения достигнуты в полном объеме по 5 из 12 целевых показателей.

Ожидаемые значения не достигнуты в полном объеме по показателям:

"Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам", что обусловлено реализацией сжиженного газа в соответствии с потребностью населения;

"Ремонт внутриквартальных проездов", "Ремонт тротуаров", "Ремонт мест стоянки автотранспортных средств", "Замена и ремонт ограждений", "Замена и ремонт малых архитектурных форм", что обусловлено сложившимися фактическими объемами выполненных работ, учитывая в том числе, влияние погодных условий и сезонность проводимых работ;

"Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда", обусловлено тем, что экономия от заключенных контрактов сформировалась во второй половине 4 квартала отчетного года, учитывая срок выполнения работ и окончание финансового года не представлялось возможным осуществить закупку на 1 объект. При этом планирование показателя происходит на основании усредненной сметы по видам работ типового объекта, а учитывая специфику и не однотипное техническое состояние каждого объекта в начале финансового года не представляется возможным определить точный объем

экономии от заключенных контрактов, по итогам конкурсных процедур и (или) фактическому объему выполненных работ подрядчиком.

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения планового значения, %
1.	Обеспечение актуального состояния утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года, ед.	1	1	100,0
2.	Обеспечение актуального состояния утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города, ед.	3	3	100,0
3.	Количество модернизированных или реконструированных существующих сетей холодного водоснабжения и водоотведения, м	4 919,39	7 295,46	148,3
4.	Количество модернизированных или реконструированных существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, ед.	11	15	136,4
5.	Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам, кг	1 076	847	78,7
6.	Ремонт внутриквартальных проездов, кв. м	6 893,00	6 575,93	95,4
7.	Ремонт тротуаров, кв. м	3 367,55	3 222,75	95,7
8.	Ремонт мест стоянки автотранспортных средств, кв. м	2 648,31	1 665,79	62,9
9.	Замена и ремонт ограждений, п. м	1 208,34	764,88	63,3
10.	Замена и ремонт малых архитектурных форм, ед.	55	54	98,2
11.	Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, ед.	36	35	97,2
12.	Общая площадь жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и бесхозных строений, используемых гражданами для проживания, в соответствии с которой производится начисление платы за жилое помещение, содержание бесхозных строений, используемых гражданами для проживания, и предоставляется субсидия на возмещение недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, тыс. кв. м	7,28	7,28	100,0


СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

98,0

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено **497,0 млн. рублей**. Расходы по муниципальной программе за счет всех источников финансирования составили **400,3 млн. рублей** или **80,5%** от плана, что обусловлено экономией при заключении контрактов на оказание услуг, а также по расходам на обеспечение функций органов местного самоуправления.

Структура источников финансирования муниципальной программы, млн. руб.

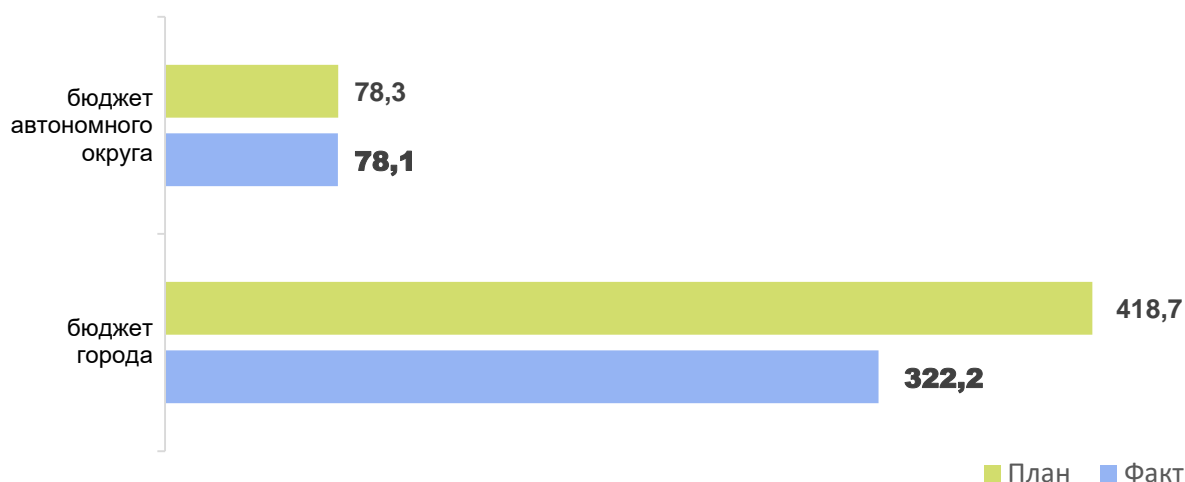

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Комплексный критерий оценки эффективности составил **7,3 балла**, степень эффективности реализации муниципальной программы – **выше средней**.
